COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BÁSICO

► Nota ao elaborador: instruções de preenchimento deste modelo

1. Todos os campos destacados em VERMELHO e entre colchetes [assim] são campos de preenchimento e devem ser completados pelo engenheiro/elaborador responsável antes da submissão.

2. Após preencher cada campo, altere a cor do texto de VERMELHO para PRETO. Ao final, não deve restar nenhum texto em vermelho no documento — exceto o que for intencionalmente mantido.

3. Os blocos iniciados por "► Nota ao elaborador:" e por "Atenção:" são orientações internas de elaboração e alertas normativos. Devem ser LIDOS e, em regra, EXCLUÍDOS antes da submissão (não integram o texto contratual).

4. Os MÓDULOS OPCIONAIS, marcados com o símbolo ◆, devem ser incluídos ou suprimidos conforme a natureza do objeto (obra, reforma, manutenção predial, serviço comum ou não comum de engenharia). Ao suprimir um módulo, renumere os itens subsequentes.

5. Selecione, nos campos com alternativas separadas por barra (ex.: [obra / serviço de engenharia]), apenas a opção aplicável, excluindo as demais.

6. As planilhas (Orçamento, Curva ABC, Cronograma, BDI) devem ser elaboradas no sistema oficial de orçamentação (Orçafascio), exportadas em PDF e anexadas ao processo no SEI como documentos próprios deste Projeto Básico.

7. Confira e atualize TODAS as referências a artigos do RLC antes da utilização. As citações constantes deste modelo refletem a 4ª versão do RLC 10.901; havendo nova versão, revise inciso a inciso (em especial os intervalos de artigos sobre recebimento, fiscalização, sanções e rescisão).

8. Este modelo está estruturado segundo os incisos I a XXX do art. 157 do RLC. Itens não aplicáveis ao objeto podem ser omitidos, desde que a omissão seja justificada expressamente no próprio documento (art. 157, §1º, do RLC).

Legenda de formatação

Elemento	Significado e ação esperada
[CAMPO]	Campo de preenchimento. Substituir pelo conteúdo e mudar a cor para preto.
► Nota ao elaborador:	Orientação de elaboração. Ler e excluir antes da submissão.
Atenção:	Alerta normativo / risco de impropriedade. Ler e, em regra, excluir antes da submissão.
◆ Módulo opcional	Cláusula condicional. Incluir ou suprimir conforme o objeto.
Texto em preto	Cláusula-padrão. Em regra, mantida; ajustar apenas se houver fundamento.

Atenção: Projeto Básico com detalhamento insuficiente — próximo ao nível de anteprojeto — compromete a formação de preços, aumenta aditivos e sujeita os elaboradores a responsabilização técnica e funcional (TCU, Acórdãos 2341/2010-P, 1977/2013-P e 594/2018-P).

Antes de publicar, verificar se este Projeto Básico contém:
a) solução técnica com especificações suficientes;
b) quantitativos apurados por levantamento ou cálculo;
c) orçamento com base em referências confiáveis;
d) cronograma compatível com a complexidade do objeto.

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO (ART. 157, I, RLC)

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de [descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara — tipo de intervenção, local, unidade da Conab beneficiada e demais informações de identificação do objeto], conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os serviços, materiais e/ou obras referenciados neste Projeto Básico enquadram-se como [obra / serviço comum de engenharia / serviço de engenharia não comum], cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

1.3. Os serviços serão executados indiretamente no regime de [empreitada por preço unitário / empreitada por preço global / contratação semi-integrada / contratação integrada].

► Nota ao elaborador: o regime escolhido deve guardar coerência com a forma de apuração dos quantitativos e com o critério de medição adotado no Anexo de Memória de Cálculo e no Cronograma. Empreitada por preço global exige projeto com grau de detalhamento suficiente para fechar o escopo; empreitada por preço unitário admite quantitativos estimados, com pagamento pelo efetivamente executado.

1.4. O critério de julgamento das propostas será o de [menor preço global / maior desconto]. O valor estimado/valor de referência será [público / sigiloso]. O modo de disputa adotado será [aberto / fechado/ aberto e fechado].

1.5. O custo total estimado para a prestação dos serviços deste Projeto Básico é de R$ [valor] ([valor por extenso]).

2. DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO E SUA JUSTIFICATIVA (ART. 157, II, RLC)

2.1. A contratação tem por objetivo [descrever o objetivo da contratação — resultado a ser alcançado].

2.2. A necessidade da contratação justifica-se por [descrever a situação atual que motiva a contratação, identificando deficiências, riscos, inadequações ou demandas da Conab a serem atendidas; referenciar estudos técnicos, laudos, inspeções ou outros documentos que

embasem a necessidade, com o respectivo número SEI].

2.3. A justificativa das especificações técnicas adotadas decorre de [fundamentar tecnicamente as especificações escolhidas, explicando por que são as mais adequadas sob os aspectos técnico e econômico. Indicar alternativas estudadas e critérios de seleção da solução adotada].

2.4. O quantitativo demandado foi calculado com base em [demonstrar como o quantitativo foi calculado: histórico de utilização, laudos técnicos, levantamentos de campo ou outras fontes confiáveis].

2.5. O serviço em apreço será contratado na modalidade [Pregão Eletrônico / Competição Pública / RDC], por ser caracterizado como serviço [obra / serviço comum / serviço não comum] de engenharia, nos termos do art. 3º, inciso [XIII / conforme enquadramento] do RLC.

► Nota ao elaborador: confirme o enquadramento do objeto (comum x não comum) antes de fixar a modalidade. O enquadramento como "comum" pressupõe padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por especificações usuais de mercado; do contrário, a modalidade de Pregão é inadequada.

3. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO (ART. 157, III, RLC)

3.1. As características essenciais da contratação são as seguintes:

Modalidade licitatória	[Pregão Eletrônico / Competição Pública / RDC]
Regime de execução	[Empreitada por preço unitário / global / integral / semi-integrada / contratação integrada / tarefa]
Critério de julgamento	[Menor preço global / Menor preço por lote / Melhor técnica e preço / Maior desconto]
Serviço continuado	[Sim / Não]
Permite subcontratação	[Sim, parcialmente — especificar percentual / Não]
Participação ME/EPP	[Exclusiva (valor ≤ R$ 80.000) / Ampla (valor > R$ 80.000)]

3.2. Trata-se de contratação de [obra / serviço de engenharia].

3.3. A forma de contratação, o regime adotado e o critério de julgamento justificam-se, ainda, por [complementar a justificativa da escolha — economicidade, complexidade do objeto, possibilidade de definição precisa do escopo, etc.].

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (ART. 157, IV, RLC)

4.1. A solução técnica adotada compreende [descrever a solução: sistema estrutural, materiais, tecnologias e métodos construtivos/executivos; indicar por que é a mais adequada sob os aspectos técnico e econômico; referenciar as normas técnicas aplicáveis (ABNT, INMETRO, NRs etc.). A solução deve conter todos os elementos detalhados com clareza, de modo a permitir a licitantes, agentes públicos e à sociedade uma visão precisa do que será realizado].

4.2. As especificações são suficientes para evitar alterações, no decorrer do empreendimento, que desvirtuem a solução escolhida, nos termos do art. 157, IV, "c", do RLC.

4.3. As especificações técnicas detalhadas por sistema constam do [Anexo IX — Especificações Técnicas] deste Projeto Básico.

◆ MÓDULO OPCIONAL — MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) (incluir conforme complexidade e porte do objeto)

4.X. O Decreto nº 10.306/2020 e a Estratégia BIM BR (Decreto nº 11.888/2024) estabelecem a adoção progressiva da metodologia BIM no âmbito da Administração Pública Federal. A aplicação do BIM neste Projeto Básico observará os critérios a seguir.

a) Aplicabilidade: a adoção do BIM será avaliada pela Fiscalização em função da complexidade técnica, do porte e valor estimado, da existência de projetos complementares interdependentes e da disponibilidade de documentação técnica prévia, com justificativa registrada nos autos.
b) Dispensa motivada: fica dispensada a exigência de BIM quando o valor estimado for inferior a R$ 300.000,00; quando o objeto se restringir a manutenção predial de baixa complexidade; quando não houver documentação técnica preexistente compatível com a modelagem; ou quando a natureza do serviço não envolver interferências entre sistemas que justifiquem a detecção por modelo. A dispensa será formalizada por justificativa técnica nos autos.
c) Quando aplicável, o BIM abrangerá, no mínimo: modelos com extração de quantitativos e documentação gráfica; orçamentação e planejamento; e atualização as-built ao término. Os modelos serão entregues em formato IFC (art. 6º do Decreto nº 10.306/2020); os direitos autorais pertencem à União; os custos de capacitação da Contratada são de sua exclusiva responsabilidade.

► **Nota ao elaborador:** a decisão pela adoção ou dispensa do BIM deve constar do ETP e ser reproduzida no Projeto Básico. Confirme, na data da contratação, a fase de adoção obrigatória em vigor (Decreto 10.306/2020 prevê adoção progressiva por fases) e o dispositivo exato do formato IFC.

4.4. Os serviços/obras deverão ser prestados no(s) seguinte(s) local(is):

Local	Unidade / Edificação	Endereço completo

[nº]	[Unidade / Edifício]	[Endereço completo, CEP]

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXOS TÉCNICOS (ART. 157, IV, RLC)

5.1. Na execução dos serviços deverão ser observadas, além das especificações deste Projeto Básico e dos projetos, as normas e especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

5.2. Demais referências normativas eventualmente propostas deverão atender, primeiramente, às normas internas da Conab; na sua ausência, às normas da ABNT; e, subsidiariamente, às normas estrangeiras.

5.3. Integram este Projeto Básico, para todos os fins, os anexos técnicos abaixo, conforme a natureza e a complexidade do objeto:

a) Projeto técnico: plantas gerais de implantação; plantas de detalhes e cortes; diagramas e esquemas; especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; padrões descritivos.
b) Estudos, levantamentos e diagnósticos: levantamentos cadastrais e fotográficos; laudos e relatórios técnicos.
c) Quantitativos e base de orçamento: memória de quantitativos; memória de cálculo; critérios de medição.
d) Outros documentos de suporte: demais documentos que subsidiaram a solução adotada.

► Nota ao elaborador: relacione apenas os anexos efetivamente aplicáveis ao objeto e assegure que cada um esteja juntado ao processo do SEI, com o respectivo número. A documentação deve ser compatível com o nível de detalhamento necessário à perfeita caracterização do objeto e à formulação das propostas.

6. DA DEFINIÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO (ART. 157, V, RLC)

6.1. [Descrever o método construtivo ou a estratégia de execução: sequência lógica das atividades, interfaces críticas, serviços preliminares, logística, medidas de proteção ao patrimônio da Conab e segurança do trabalho. Quando não aplicável, indicar: “Conforme descrito no item 4 deste Projeto Básico”].

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO (ART. 157, VI, RLC)

7.1. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até [XX] dias, contados da assinatura do Contrato e da emissão da Ordem de Serviço.

7.2. O prazo total de execução é de [XX dias corridos / meses]. Justificativa: [justificar o prazo com base na complexidade, nos quantitativos e no Cronograma Físico-Financeiro].

7.3. Para os serviços por demanda/eventuais, o prazo de cada execução será definido conforme o cronograma de cada demanda, não podendo ultrapassar o limite máximo da vigência contratual.

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (ART. 157, VII, RLC)

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de [XX meses / XX dias], contados da data de sua assinatura, nos termos dos arts. 461 e 462 do RLC.

8.2. A vigência contempla o prazo de execução acrescido dos prazos de recebimento provisório e definitivo, bem como de eventual prorrogação prevista no RLC.

► **Nota ao elaborador:** em serviços de natureza continuada, indicar o prazo inicial (em regra, 12 meses) e a possibilidade de prorrogação até o limite do RLC, com os requisitos cumulativos (interesse da Conab, vantajosidade comprovada por pesquisa de preços, dotação, regularidade da Contratada e autorização competente). Verifique os artigos de prorrogação na versão vigente do RLC.

9. DA VISTORIA TÉCNICA (ART. 157, VIII, RLC)

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante [poderá / deverá] realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, tomando ciência das características e peculiaridades existentes.

9.2. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das [horário], mediante agendamento prévio pelo telefone [telefone] ou pelo e-mail [e-mail].

9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital e estender-se-á até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

9.4. Optando por realizar a vistoria, o licitante apresentará a Declaração de Vistoria Técnica (**[Anexo IV]**); optando por não realizá-la, apresentará a Declaração de Dispensa de Vistoria Técnica (**[Anexo V]**), assumindo integral responsabilidade por eventuais erros de dimensionamento da proposta.

► **Nota ao elaborador:** a vistoria não pode ser exigida em data única nem necessariamente pelo futuro responsável técnico (vedação do art. 157, VIII, “e”, do RLC). Se exigida como requisito de habilitação, o motivo da obrigatoriedade deve ser justificado nos autos (art. 157, VIII, “c”).

10. DA AMOSTRA OU DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS (ART. 157, IX, RLC)

10.1. [Indicar se haverá exigência de amostra ou demonstração prévia, com as condições e os critérios de avaliação. Se não aplicável, inserir: “Considerando a natureza da contratação, não será exigida amostra ou demonstração prévia”].

11. DOS CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE (ART. 157, X, RLC)

11.1. [Indicar se haverá referências comerciais/marcas para fixação de padrão de qualidade. Sendo o caso, acrescentar expressamente

"ou equivalente/similar aprovado pela Fiscalização". Se não aplicável, inserir: "Considerando a natureza da contratação, item não aplicável"].

► Nota ao elaborador: referências comerciais só são admitidas para estabelecer padrão de qualidade e não podem frustrar o caráter competitivo do certame (art. 157, X). O equivalente técnico deve ser submetido à aprovação da Fiscalização antes da aplicação.

12. DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART. 157, XI, RLC)

12.1. A Contratada deverá apresentar à Conab, em até [XX] dias corridos da assinatura do Contrato, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) registrados no CREA/CAU, em nome do(s) responsável(is) técnico(s).

12.2. Os custos das ART/RRT emitidas pela Contratada durante a execução são de sua exclusiva responsabilidade (art. 157, XI, "b").

12.3. A Contratada apresentará a baixa da ART/RRT em até [XX] dias úteis após a finalização das obras ou serviços (art. 157, XI, "c").

12.4. É dever do gestor exigir a ART/RRT do empregado da Conab responsável pela elaboração do Projeto Básico/Executivo, pela execução, supervisão e fiscalização (art. 157, XI, "d" e "e"). Os custos dessas ART/RRT, emitidas a serviço da Companhia, são por ela suportados (art. 157, XI, "f").

13. DA HABILITAÇÃO — QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL (ART. 157, XII, RLC)

► **Nota ao elaborador:** é vedada a réplica automática de critérios de processos anteriores. Os requisitos de qualificação técnica devem ser definidos a partir da análise específica do objeto e justificados nos autos, abrangendo:
a) identificação das parcelas de maior relevância técnica e econômica, com percentual aproximado no custo total;
b) demonstração de que a exigência de CAT/atestado se limita a essas parcelas, não ao objeto integral;
c) proporcionalidade dos quantitativos mínimos, quando exigidos;
d) fundamentação da exigência de atestado de capacidade técnico-operacional, quando cumulada com a CAT.
A ausência de justificativa ou a adoção de critérios desproporcionais constitui irregularidade passível de impugnação e de apontamento em auditoria.

13.1. Qualificação técnica

13.1.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.

13.1.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do(s) responsável(is) técnico(s), comprovando responsabilidade por serviços de características semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e econômica do objeto, em especial:

I - [Descrever a parcela técnica relevante nº 1 — ex.: execução de estrutura em concreto armado com volume mínimo de [X] m³]

II - [Descrever a parcela técnica relevante nº 2 — ex.: instalação e startup de grupo motor-gerador com capacidade mínima de [X] kVA]

III - [Adicionar outras parcelas relevantes, conforme as características do objeto]

13.1.2.1. A definição das parcelas de maior relevância é justificada nos autos, com base na análise das especificações e na identificação dos serviços que, por complexidade ou impacto no resultado, demandam comprovação específica. Parcelas que correspondam à totalidade do objeto contrariam o art. 157, XII, do RLC.

13.1.3. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando execução de serviços semelhantes em [especificar tipo de edificação/instalação e, quando cabível, quantitativo mínimo proporcional, ≤ 50% dos itens de maior relevância]. Admite-se o somatório de atestados.

13.1.4. As exigências observam as vedações do art. 157, XII, do RLC, sendo expressamente vedadas: exigência de certificados ISO, cartas de solidariedade ou documentos de garantia de qualidade ("e"); exigência de visto/registro local de CREA/CAU no momento da habilitação ("f"); fixação de número mínimo de atestados ou limitação de tempo de experiência ("h"); percentuais mínimos acima de 50% dos itens de maior relevância ("i"); e restrição a tipologias específicas de obras/serviços ("j").

Atenção: exigência de atestado com quantitativos mínimos para capacitação técnico-*profissional* (art. 157, XII, "b") só é admitida quando o objeto for de natureza predominantemente intelectual, o que, em regra, não é o caso de obras e serviços comuns de engenharia. Para estes, fundamente a exigência na capacidade técnico-*operacional* (art. 157, XII, "d"), limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo.

13.2. Qualificação econômico-financeira

13.2.1. Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Prazo de validade da certidão: [definir no Edital - em regra, até 60 dias da emissão; se não consignar validade, admitir emissão nos últimos 180 dias]

► **Nota ao elaborador:** O art. 133, § 6º, do RLC, aplicável aos termos de referência para serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, exige a certidão negativa de falência, mas não estabelece prazo de validade. Assim, caberá ao Projeto Básico definir o prazo de validade da certidão, observada a prática administrativa adotada pela Companhia.

Atenção: Os requisitos dos itens 13.2.2 a 13.2.5 correspondem aos requisitos previstos no art. 133, § 6º, do RLC. Compete ao elaborador avaliar a pertinência e a necessidade de sua exigência, conforme as características da contratação e a devida motivação do processo.

13.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

13.2.3. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

13.2.4. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

13.2.5. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo do Anexo IV deste Regulamento, de que um doze avos dos Contratos firmados com a Administração Pública ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no inciso anterior, observados os seguintes requisitos:

13.2.5.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

13.2.5.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

14. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE (ART. 157, XIII, RLC)

14.1. A Contratada observará os critérios de sustentabilidade do art. 157, XIII, do RLC, especialmente:

a) especificações que visem à economia de manutenção e operação, à redução do consumo de energia e água e ao uso de tecnologias e materiais de menor impacto ambiental (“a”);

b) uso obrigatório de agregados reciclados, sempre que houver oferta, capacidade de suprimento e custo inferior aos naturais (“b”);

c) cumprimento do PGRCC (Resolução CONAMA nº 307/2002), com Controle de Transporte de Resíduos (CTR) para todos os resíduos removidos (“c”);

d) uso de produtos de limpeza e conservação conformes às classificações da ANVISA (“d”);

e) medidas para evitar o desperdício de água tratada (“e”);

f) fornecimento e exigência de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários (“f”).

14.2. A Contratada é responsável, administrativa, civil e penalmente, por qualquer dano ambiental decorrente da execução, sendo vedado o descarte irregular de resíduos.

► **Nota ao elaborador:** os critérios de sustentabilidade devem ser definidos de acordo com a natureza e o escopo da contratação, evitando a reprodução automática de cláusulas aplicáveis apenas a obras civis. Para serviços de engenharia em instalações elétricas, climatização, sistemas especiais ou manutenção predial, incluir apenas as exigências pertinentes ao objeto, tais como eficiência energética, utilização de equipamentos certificados ou com selo de eficiência energética quando tecnicamente justificável, emprego de tecnologias de menor consumo, logística reversa e destinação ambientalmente adequada de lâmpadas, baterias, cabos, equipamentos eletroeletrônicos e demais resíduos, observadas a legislação ambiental, as normas técnicas e as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Excluir exigências incompatíveis com o objeto e justificar, quando necessário, a adoção ou a dispensa de requisitos específicos.

15. DOS CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (ART. 157, XIV, RLC)

15.1. Somente será aceito o objeto em consonância com este Projeto Básico quanto a quantidade, qualidade e funcionamento.

15.2. Os serviços serão executados conforme as normas técnicas vigentes, em especial:

a) [Listar as normas técnicas aplicáveis ao objeto — ABNT, NRs, normas das concessionárias etc.]

b) Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

c) Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) 10.901 da Conab.

15.3. Durante a vigência, a Conab adotará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), constante do [Anexo VII], com critérios objetivos para efeito de pagamento, podendo ensejar multa e rescisão.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL (ART. 157, XV, RLC)

16.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

16.2. O recebimento provisório será realizado pela Fiscalização em até [XX] dias corridos do adimplemento da parcela/entrega, formalizado em Termo de Recebimento Provisório detalhado, encaminhado ao responsável pelo recebimento definitivo.

► **Nota ao elaborador:** para o recebimento complexo de obras e serviços de engenharia, o art. 533, I, "a", do RLC fixa até **15 (quinze) dias** para a emissão do Termo de Recebimento Provisório após o término, e o art. 533, I, "c", concede prazo de até **30 (trinta) dias** para saneamento de pendências. Ajuste o campo [XX] a esses parâmetros ou justifique prazo diverso.

16.3. O recebimento definitivo, que concretiza o ateste da execução, será realizado pelo empregado ou comissão designada em até [XX] dias corridos do recebimento provisório, após verificação de toda a documentação.

16.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil por vícios e defeitos ocultos, na forma do Código Civil.

16.5. O recebimento definitivo ficará condicionado à verificação, pela Fiscalização ou pela comissão designada, da completa entrega da documentação técnica e administrativa aplicável ao objeto, compreendendo, conforme a natureza da contratação: Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execução e respectiva baixa, quando exigível; projetos e desenhos "*as built*"; manuais de operação, uso e manutenção; certificados de ensaios, comissionamento, calibração, conformidade ou garantia; relatórios técnicos; documentação exigida pelas concessionárias ou órgãos competentes; e demais documentos previstos neste Projeto Básico, seus anexos ou nas normas técnicas aplicáveis.

16.6. Quando previsto nas Especificações Técnicas ou em outro documento integrante deste Projeto Básico, o recebimento definitivo também dependerá da realização do treinamento operacional dos empregados indicados pela Conab, bem como da entrega dos respectivos registros ou certificados de treinamento.

Atenção: em empreitada por preço global, a soma dos pagamentos até a última medição não pode superar 90% do valor global, e o saldo (não inferior a 10%) só é liberado após o Termo Circunstanciado no recebimento definitivo (art. 532, §§3º e 4º, do RLC).

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ART. 157, XVI, RLC)

17.1. São obrigações da Contratante:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, conforme as cláusulas contratuais e os termos da proposta;

b) receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

d) comunicar à Contratada, por escrito, imperfeições, falhas ou irregularidades, para reparo ou correção;

e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com este Projeto Básico;

f) acompanhar e fiscalizar a execução por meio de empregado ou comissão designados;

g) efetuar o pagamento no prazo e na forma estabelecidos;

h) não praticar atos de ingerência na administração da Contratada (poder de mando sobre empregados, direcionamento de contratações, desvio de função, etc.); e providenciar as ART dos empregados da Conab responsáveis pela supervisão e fiscalização, arcando com os respectivos custos.

17.2. A Conab não responderá por compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ART. 157, XVII, RLC)

18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

a) apresentar as ART/RRT registradas no CREA/CAU em até **[XX]** dias corridos da assinatura do Contrato;

b) executar os serviços conforme este Projeto Básico e sua proposta, com a alocação dos profissionais necessários;

c) iniciar os serviços somente após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Conab;

d) seguir o Cronograma Físico-Financeiro, comunicando imediatamente qualquer impossibilidade de cumprimento;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução, na forma da legislação aplicável;

f) proteger adequadamente os bens da Conab no local e restituí-los ao término;

g) submeter à aprovação prévia da Conab toda substituição de materiais e equipamentos de referência;

h) manter sigilo sobre assuntos de interesse da Conab ou de terceiros acessados na execução;

i) manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas, inclusive a regularidade no SICAF;

j) cumprir as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias, inclusive as previstas em Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo;

k) vedar o trabalho de menor de 16 anos (salvo aprendiz a partir de 14) e o trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menor de 18 anos;

l) indicar e manter preposto para representá-la durante a execução;

m) arcar com o ônus de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, ressalvadas as hipóteses do RLC;

n) obedecer às normas oficiais e às recomendações dos fabricantes, fornecendo materiais, mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos e EPIs;

o) não se prevalecer de erro ou omissão deste Projeto Básico para eximir-se de responsabilidades;

p) garantir aos seus empregados na execução do contrato, política de respeito à diversidade, prevenção a práticas discriminatórias e de alinhamento com os princípios institucionais de equidade de gênero e raça.

18.2. ◆ **MÓDULO OPCIONAL - BIM (incluir somente se o item 4.4 for aplicável)**

18.2.1. Adotar a metodologia BIM na execução dos serviços, nos termos do item 4.4 deste Projeto Básico, disponibilizando os modelos à Fiscalização no formato IFC ao final de cada etapa e, obrigatoriamente, no recebimento provisório.
[Incluir obrigações específicas decorrentes da natureza do objeto — ex.: segurança do trabalho, ambientais, prestação de informações técnicas, transição contratual com transferência de conhecimento etc.].
► **Nota ao elaborador:**A decisão pela adoção ou dispensa do BIM deverá constar do ETP e ser reproduzida no Projeto Básico.

19. DO PAGAMENTO (ART. 157, XVIII, RLC)

19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório ou definitivo dos serviços, conforme o caso.

19.2. O pagamento será efetuado pela Conab em até [XX] dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, observado o teto legal do RLC.

19.3. A Nota Fiscal/Fatura conterá, no mínimo: prazo de validade; data de emissão; dados do Contrato e da Conab; período de prestação; valor a pagar; e tributos a reter na fonte.

19.4. Antes de cada pagamento será realizada consulta ao SICAF. Resultado desfavorável concederá prazo de 5 (cinco) dias úteis para

regularização ou defesa.

19.5. Dos pagamentos serão retidos os impostos e contribuições devidos na fonte, conforme a legislação vigente.

19.6. No atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Conab, o valor devido será acrescido de atualização financeira por meio da fórmula EM = I × N × VP, com I = 0,00016438 (correspondente à taxa de 6% a.a.).

► **Nota ao elaborador:** padronize a taxa de mora com a do RLC vigente. O texto original deste anexo trazia, simultaneamente, "0,5% ao mês" e o índice diário I = 0,00016438 (que equivale a 6% a.a.); são premissas distintas. Verifique e mantenha apenas a correta.

20. DO REAJUSTAMENTO / REPACTUAÇÃO DO CONTRATO (ART. 157, XIX, RLC)

20.1. Observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços serão reajustados/repactuados por solicitação da Contratada.

20.2. O pedido será fundamentado por [novo Acordo/Dissídio/Convenção Coletiva, para custos de mão de obra; e/ou planilha de custos com variação comprovada, para os demais custos].

20.3. Para os custos sujeitos à variação de mercado, o índice de reajuste será o [INCC-DI/FGV / INPC-IBGE / IPCA / outro — justificar].

20.4. As repactuações/reajustes serão formalizados por apostilamento, exceto quando coincidirem com prorrogação contratual, caso em que serão formalizados por termo aditivo.

21. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVIÇO DE ENGENHARIA (ART. 157, XX, RLC)

21.1. Os serviços terão garantia de, no mínimo, [06 meses / XX anos], contados do recebimento definitivo.

21.2. Para obras de engenharia, a garantia mínima contra vícios e defeitos ocultos é de 5 (cinco) anos (art. 618 do Código Civil).

21.3. Materiais, peças e componentes substituídos serão garantidos pelo prazo do fabricante, quando superior ao mínimo legal.

21.4. Durante a garantia, a Contratada refará o serviço, ou parte dele, no prazo estabelecido pela Conab, após comunicada.

► **Nota ao elaborador:** As garantias específicas de materiais, equipamentos, sistemas e componentes, quando aplicáveis, serão estabelecidas no **Caderno de Especificações (Anexo IX)** e prevalecerão sobre a garantia mínima prevista neste Capítulo sempre que fixarem prazo superior.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL (ART. 157, XXI, RLC)

22.1. A Contratada apresentará, em até [10] dias corridos após a assinatura, garantia de [5%] do valor total do Contrato, em uma das modalidades (à sua escolha): (a) caução em dinheiro; (b) seguro-garantia; ou (c) fiança bancária.

22.2. A garantia assegurará o pagamento de: prejuízos do não cumprimento do objeto; prejuízos diretos à Conab ou a terceiros; multas contratuais; e obrigações trabalhistas e previdenciárias não adimplidas.

22.3. A garantia terá validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência. O atraso na entrega acarretará multa de 0,08% ao dia, até o máximo de 2%; atraso superior a 25 dias autoriza a rescisão.

23. DA PREVISÃO DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA (ART. 157, XXII, RLC)

23.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada, desde que: (a) observados todos os requisitos de habilitação da licitação; (b) mantidas as demais cláusulas e condições; (c) não haja prejuízo à execução; e (d) haja anuência expressa da Conab.

24. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO (ART. 157, XXIII, RLC)

24.1. Adotar-se-á o método baseado em delegação de responsabilidade, com os seguintes papéis:

a) Fiscal Técnico: acompanha e fiscaliza tecnicamente a execução, verifica os resultados e realiza o recebimento provisório;

b) Fiscal Administrativo/Funcional: verifica as obrigações funcionais e trabalhistas, afere a conformidade documental e emite o IMR;

c) Preposto da Contratada: representante responsável por acompanhar a execução e atuar como interlocutor com a Conab.

24.2. A gestão e a fiscalização observarão os artigos do RLC sobre gestão e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia.

24.3. O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e de FGTS da mão de obra alocada.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 157, XXIV, RLC)

25.1. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, o inadimplemento sujeitará a Contratada às sanções previstas no RLC e na Lei nº 13.303/2016:

a) Advertência, para infrações de menor gravidade, sem prejuízo à execução do objeto;

b) Multa moratória de [____]% ao dia sobre o valor inadimplido, pelo atraso na execução, até o limite de [____]%;

c) Multa compensatória de [____]% do valor total do Contrato, pelo descumprimento grave ou rescisão por culpa da Contratada;

d) Multa rescisória de [____]% nos casos de rescisão unilateral por descumprimento contratual;

e) Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Atenção: os percentuais de multa devem ser definidos pelo elaborador em harmonia com os prazos de execução (itens 7 e 16) e com o IMR (Anexo VII). O prazo de suspensão NÃO é discricionário: o RLC fixa o teto de 2 (dois) anos — não estipule prazo superior.

25.2. As multas são autônomas, podendo ser aplicadas cumulativa ou isoladamente, e serão descontadas da garantia ou dos pagamentos; o saldo excedente será cobrado judicialmente. A aplicação das sanções será registrada no SICAF.

26. DA MATRIZ DE RISCOS E QUADRO DE INOVAÇÕES (ART. 157, XXV, RLC)

26.1. A Matriz de Riscos é a cláusula definidora dos riscos e das responsabilidades entre Contratante e Contratada e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, constando do **[Anexo II]** deste Projeto Básico.

26.2. A Contratada só poderá solicitar reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses alocadas à Contratante na Matriz de Riscos; fica vedada a celebração de aditivos por eventos alocados à Contratada.

26.3. Em obras e serviços de engenharia, além da Matriz de Riscos, é necessário o preenchimento do Quadro de Inovações (art. 157, XXV, c/c art. 210, III, do RLC), constante do **[Anexo II-A]**.

27. DA ORÇAMENTAÇÃO (ART. 157, XXVI, RLC)

27.1. As planilhas orçamentárias da contratação, elaboradas conforme o RLC (orçamento estimativo de obras e serviços de engenharia), constam do **[Anexo X — Memória de Cálculo]** e do **[Anexo de Orçamento Analítico]**, com indicação da fonte de cada item (SINAPI como referência primária; SICRO para obras rodoviárias; demais fontes apenas mediante justificativa de inviabilidade).

28. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO CUSTO (ART. 157, XXVII, RLC)

28.1. A estimativa adotou o critério de [MÉDIA / MEDIANA/MENOR PREÇO] dos preços, obtidos por [tabela SINAPI / tabela SICRO / pesquisa em contratos da Administração Pública / pesquisa de mercado - justificar].

28.2. Os custos diretos sem BDI totalizam R$ [XXX.XXX,XX]. O BDI adotado é de [XX,XX]%, resultando no valor estimado total de R$ [XXX.XXX,XX].

29. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ART. 157, XXVIII, RLC)

29.1. [Apresentar o Cronograma Físico-Financeiro detalhado (Anexo próprio), com etapas, percentuais físicos e desembolsos mensais. Quando, em razão da natureza do objeto (execução sob demanda, sem quantitativos predeterminávels), não for possível estabelecê-lo, indicar expressamente a omissão e sua justificativa, nos termos do art. 157, §1º, do RLC].

► Nota ao elaborador: o cronograma deve guardar compatibilidade com a sequência executiva, as medições e a curva de desembolso, evitando etapas genéricas incompatíveis com o regime de execução adotado.

30. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (ART. 157, XXIX, RLC)

30.1. O custo total estimado é de R$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]).

30.2. Os recursos correrão à conta do Orçamento da União para a Conab, conforme dados orçamentários fornecidos pela área financeira nos autos do processo.

31. DA SUBCONTRATAÇÃO (ART. 157, XXX, RLC)

31.1. [É permitida a subcontratação parcial de até XX% — especificar parcelas / Não será admitida a subcontratação do objeto], vedada, em qualquer caso, a subcontratação total (art. 524 do RLC).

31.2. A subcontratação não transfere responsabilidade: a Contratada permanece integralmente responsável pela perfeita execução, padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade. A subcontratada deverá comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica da parcela. É vedada a subcontratação de quem tenha participado da licitação ou da elaboração deste Projeto Básico.

32. DA RESCISÃO CONTRATUAL

32.1. A rescisão, total ou parcial, observará as hipóteses e o procedimento do RLC e da Lei nº 13.303/2016, assegurados o contraditório e a ampla defesa, incluindo: inexecução total ou parcial; não apresentação ou recomposição da garantia; falência ou insolvência; perda das condições de habilitação; e razões de interesse público mediante despacho motivado.

33. DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

33.1. São vedadas as contratações que configurem nepotismo, notadamente aquelas que envolvam relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da Conab, com empregado cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação/contratação ou com autoridade ministerial à qual a Conab se vincule, nos termos do art. 12, §1º, inciso II, do RLC e do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010.

► **Nota ao elaborador:** a minuta anterior citava "art. 12, **parágrafo único**" - inexistente, pois o art. 12 possui §1º e §2º (não há parágrafo único). A vedação por parentesco/nepotismo está no **art. 12, §1º, inciso II**, do RLC. Referência corrigida neste modelo.

34. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E RELAÇÃO DE ANEXOS

34.1. Este Projeto Básico foi elaborado com base no RLC 10.901 (4ª versão, Resolução Consad nº 020, de 30/12/2024) e nas normas

técnicas aplicáveis, constituindo o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do certame e à contratação do objeto.

34.2. A Conab poderá revogar a licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

34.3. Integram este Projeto Básico os seguintes Anexos:

a) Anexo I — Visão Geral dos Serviços;
b) Anexo II — Matriz de Riscos (e Anexo II-A — Quadro de Inovações, para obras e serviços de engenharia);
c) Anexo III — Modelo de Apresentação de Proposta;
d) Anexo IV — Modelo de Declaração de Vistoria;
e) Anexo V — Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria;
f) Anexo VI — Modelo de Declaração de Contratos Firmados;
g) Anexo VII — Modelo de Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
h) Anexo VIII — Modelo de Placa de Obra/Serviço de Engenharia;
i) Anexo IX — Especificações Técnicas;
j) Anexo X — Memória de Cálculo;
k) Anexo XI — Curva ABC de Serviços (referência);
l) Anexo XII — Orçamento Analítico (referência);
m) Anexo XIII — Cronograma Físico-Financeiro (referência).

► **Nota ao elaborador: [Listar/ajustar os anexos efetivamente aplicáveis ao objeto e renumerá-los na ordem em que forem referenciados no corpo do Projeto Básico.]**

Local e data: [CIDADE – UF], [DATA].

Aprovo o presente Projeto Básico e seus Anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coerência das justificativas e dos objetivos em relação à contratação (arts. 100, V, e 131 do RLC).

Elaborado por:		
[Nome / Matrícula] [CREA/CAU nº] [Área/Superintendência]	[Nome / Matrícula] [CREA/CAU nº] [Área/Superintendência]	[Nome / Matrícula] [CREA/CAU nº] [Área/Superintendência]
Aprovado por:		
[Nome / Matrícula] [Área/Gerência/Superintendência]	[Nome / Matrícula] [Área/Gerência/Superintendência]	[Nome / Matrícula] [Área/Gerência/Superintendência]

ANEXOS

ANEXO I — CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

► **Nota ao elaborador:** esta Visão Geral é o quadro-resumo descritivo do objeto. Preencha cada bloco com informações reais e exclua estas notas antes da submissão.

1. Objeto e localização

1.1. [Denominação completa do objeto] e número do Processo SEI: [nº SEI];

1.2. Tipo de intervenção (obra nova, reforma, ampliação, manutenção, adequação etc.);

1.3. Regime de execução adotado;

1.4. Para cada local: nome da unidade Conab, endereço completo e CEP (quando houver múltiplos locais, apresentar em tabela).

2. Diagnóstico da situação atual e solução proposta

2.1. Situação atual das instalações/sistemas, com identificação das deficiências, inadequações ou demandas que motivam a contratação, em estrita observância às normas de planejamento do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da Conab;

2.2. Solução técnica adotada, com visão global da intervenção e de todos os seus elementos constitutivos;

2.3. Resultado esperado, em termos de condição de funcionamento, adequação normativa ou padrão técnico a ser alcançado.

Atenção: é vedada a descrição genérica, incapaz de demonstrar a necessidade da Conab ou de possibilitar ao licitante o dimensionamento da proposta, conforme diretrizes do Projeto Básico previstas no RLC da Conab.

3. Escopo dos serviços (Relacionar todos os sistemas/especialidades abrangidos, indicando, para cada um, a natureza da intervenção (execução, manutenção preventiva, corretiva, substituição, adequação) e o local. Para manutenção predial, discriminar separadamente preventiva e corretiva. Sistemas mínimos a considerar, conforme aplicável:)

3.1. Sistema elétrico de baixa tensão (cabines, quadros, redes, iluminação, tomadas, aterramento, SPDA);

3.2. Sistema hidrossanitário (água fria/quente, esgoto, ventilação, drenagem pluvial, reservatórios, bombas, registros, louças);

3.3. Combate e detecção de incêndio (central, detectores, hidrantes, extintores, AVCB);

3.4. Climatização (split, VRF, chillers, fan-coils, dutos) e ventilação/exaustão mecânica;

3.5. Instalações civis (estrutura, vedações, revestimentos, pisos, forros, coberturas, esquadrias, vidros, impermeabilização, pintura, serralheria);

3.6. Marcenaria e mobiliário fixo; instalações lógicas/telefônicas/dados; CFTV e controle de acesso; gás; infraestrutura externa (pavimentação, drenagem, muros, calçadas, paisagismo).

4. Limitações, exclusões e informações complementares

4.1. Serviços/sistemas excluídos do escopo, com justificativa; interfaces com outros contratos; restrições operacionais (horários, áreas de acesso restrito, sistemas que não podem ser interrompidos);

4.2. Área construída (m²); número de pavimentos e uso; ano de construção/última reforma; laudos e projetos existentes (as-built), com número SEI.

5. Mobilização, canteiro e dispositivos iniciais

5.1. Obrigação de apresentação de layout do canteiro (localização de barracões, depósito de materiais, sanitários e área de descarte de resíduos) para aprovação prévia da Fiscalização;

5.2. Delimitação do canteiro para impedir acesso de pessoas não autorizadas, com proteção de bens de terceiros e livre trânsito em vias públicas;

5.3. Diário de Obra: formato (físico encadernado em triplicata ou versão eletrônica de igual padrão, a critério da Fiscalização); conteúdo mínimo por registro (materiais aplicados, mão de obra, andamento, comunicações recíprocas); destinação das vias; data de encerramento (coincidente com a baixa da ART);

5.4. Registro fotográfico: frequência mínima de entrega e quantidade mínima de imagens por período;

6. Segurança e saúde no trabalho

6.1. Obrigação de cumprimento integral das Normas Regulamentadoras do MTE aplicáveis ao objeto, indicando no mínimo: NR-4 (SESMT), NR-6 (EPI), NR-18 (Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias) e NBR 7678/1983;

6.2. Apresentação, antes do início dos serviços, do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ou outro documento que venha a substituí-lo na legislação vigente, e do PCMSO;

6.3. Lista dos EPIs obrigatórios para cada atividade de risco presente no objeto (capacete, calçado de segurança, luvas, óculos, protetor facial, cinto tipo paraquedista para trabalhos em altura, protetor auricular, máscara etc.);

6.4. Vedação de permanência de trabalhadores no canteiro sem EPI básico e uniforme;

6.5. Responsabilidade exclusiva da Contratada pelo fornecimento, manutenção e reposição de EPIs e uniformes.

7. Condições operacionais de execução

7.1. Horário ordinário de execução dos serviços (dias da semana, horário de início e término);

7.2. Condições para trabalho em horário extraordinário ou em dias não úteis: antecedência mínima para solicitação, forma de autorização (escrita), obrigação de fixação da autorização em local visível no canteiro;

7.3. Responsabilidade exclusiva da Contratada pelo cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes de trabalho extraordinário;

7.4. Obrigação de manutenção do canteiro e seu entorno em condições de limpeza e organização durante toda a execução.

ANEXO II — MATRIZ DE RISCOS (ANEXO II, RLC)

Objeto: [reproduzir a descrição do objeto].

Identificação					**Avaliação (5)**			**Tratamento ao risco**	
Item	**Fase (1)**	**Evento de risco (2)**	**Causas (3)**	**Consequências (4)**	**Probabilidade (P)**	**Impacto (I)**	**Nível de risco (P×I) (6)**	**Resposta ao risco (7)**	**Responsável (8)**
1	Planejamento da Contratação	Especificação técnica insuficiente ou imprecisa no Projeto Básico/Termo de Referência.	Levantamento de campo incompleto; ausência de estudos técnicos preliminares; reprodução de modelo de outro processo sem adaptação ao objeto.	Impugnações ao edital; propostas incompatíveis entre si; necessidade de retificação do instrumento ou de aditivos contratuais.	3	4	**12**	Revisão técnica normativa do instrumento antes da publicação, com verificação do nível de detalhamento exigido pelo art. 157 do RLC.	Contratante
2	Planejamento da Contratação	Estimativa de preços desatualizada ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Uso de tabela de referência (SINAPI/SICRO) desatualizada; pesquisa de mercado insuficiente ou com poucas fontes.	Licitação deserta ou fracassada; propostas acima do valor de referência; necessidade de nova pesquisa e republicação.	3	3	**9**	Atualização periódica das bases de preço antes da publicação; pesquisa com pluralidade de fontes, nos termos do art. 160 do RLC.	Contratante

3	Planejamento da Contratação	Indisponibilidade ou insuficiência de dotação orçamentária (ND/PTRES/Fonte) na data da contratação.	Ausência de reserva orçamentária prévia; contingenciamento; desalinhamento entre o cronograma da contratação e o exercício financeiro.	Suspensão do processo licitatório; impossibilidade de assinatura do Contrato no prazo previsto.	2	4	**8**	Confirmação da disponibilidade orçamentária junto à área financeira antes da autorização do certame.	Contratante
4	Planejamento da Contratação	Definição de prazo de execução incompatível com a complexidade do objeto.	Ausência de cronograma físico-financeiro tecnicamente fundamentado; subestimação das etapas executivas.	Necessidade de prorrogação; aplicação de penalidades indevidas; atraso na entrega do objeto.	2	3	**6**	Elaboração do cronograma com base em produtividades de referência, com validação técnica prévia à publicação.	Contratante
5	Planejamento da Contratação	Exigências de qualificação técnica desproporcionais ou sem justificativa nos autos.	Reprodução automática de critérios de processos anteriores, sem análise específica do objeto.	Impugnação ao instrumento convocatório; restrição indevida da competitividade; apontamento em auditoria.	2	3	**6**	Justificativa expressa nos autos das parcelas de maior relevância técnica e econômica, observadas as vedações do art. 157, XII, do RLC.	Contratante
6	Planejamento da Contratação	Matriz de Riscos elaborada de forma genérica, dissociada das características reais do objeto.	Reaproveitamento de matriz de outro processo sem adaptação; ausência de aplicação da metodologia de gestão de riscos da Companhia.	Alocação inadequada de riscos entre as partes; pleitos de reequilíbrio fora das hipóteses efetivamente previstas.	2	3	**6**	Elaboração da Matriz conforme a metodologia da Área de Gestão de Riscos da Companhia (art. 126, §5º, do RLC), com envio prévio para análise quando o valor superar R$ 300.000,00 (art. 126, §7º).	Contratante
7	Seleção de Fornecedores	Licitação deserta ou fracassada.	Estimativa de preços incompatível com o mercado; exigências de habilitação restritivas; baixo interesse do mercado no objeto ou no prazo ofertado.	Necessidade de republicação; atraso no atendimento da necessidade da Conab.	2	3	**6**	Ampla divulgação do certame; reavaliação da estimativa de preços e das exigências de habilitação antes da republicação.	Contratante
8	Seleção de Fornecedores	Impugnações e recursos administrativos que atrasam a homologação.	Falhas ou ambiguidades no instrumento convocatório e nos anexos técnicos; exigências não fundamentadas nos autos.	Prorrogação do prazo do certame; insegurança jurídica quanto ao resultado da licitação.	3	2	**6**	Revisão jurídica e técnica prévia do instrumento convocatório; resposta tempestiva e fundamentada às impugnações e recursos.	Contratante
9	Seleção de Fornecedores	Habilitação de licitante com restrição não detectada tempestivamente.	Falha na consulta ao SICAF e a cadastros de impedidos; documentação de habilitação apresentada de forma incompleta.	Necessidade de desclassificação posterior; risco de contratação de empresa inidônea.	2	4	**8**	Consulta obrigatória e documentada ao SICAF e aos cadastros de sanções antes da habilitação do licitante.	Contratante
10	Seleção de Fornecedores	Indícios de conluio entre licitantes (formação de cartel).	Propostas com valores muito próximos entre concorrentes; padrão atípico de participação ou de desistência.	Contratação por valor não competitivo; risco de nulidade do certame; necessidade de representação ao órgão de controle competente.	1	5	**5**	Análise dos indícios pela Comissão de Licitação, com comunicação ao órgão de controle competente quando confirmados.	Contratante

11	Seleção de Fornecedores	Proposta vencedora com preço inexequível.	Erro de dimensionamento pelo licitante; desconhecimento das condições locais de execução.	Risco de inexecução contratual; necessidade de diligência de exequibilidade antes da adjudicação.	2	3	**6**	Diligência de exequibilidade antes da adjudicação, com exigência de justificativa detalhada da composição de custos.	Contratante
12	Gestão do Contrato	Atraso no início da execução por falta de emissão da Ordem de Serviço ou de liberação da área.	Demora administrativa interna da Conab; pendências de vistoria ou de desocupação do local de execução.	Deslocamento do cronograma físico-financeiro; pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro pela Contratada.	2	3	**6**	Planejamento prévio da liberação da área e da emissão da Ordem de Serviço, alinhado à data de assinatura do Contrato.	Contratante
13	Gestão do Contrato	Variação relevante de preços de insumos ou escassez de materiais durante a execução.	Fatores de mercado supervenientes à contratação, alheios à vontade das partes.	Pleito de reequilíbrio econômico-financeiro; risco de paralisação parcial dos serviços.	2	3	**6**	Avaliação do pleito à luz da alocação de riscos desta Matriz, com comprovação documental da variação e formalização por termo aditivo, quando cabível.	Contratante
14	Gestão do Contrato	Inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS pela Contratada.	Dificuldades financeiras da Contratada; deficiência de controle interno da folha de pagamento.	Responsabilização subsidiária da Conab; paralisação de mão de obra; retenção de pagamentos.	2	4	**8**	Fiscalização mensal da regularidade trabalhista e previdenciária, com retenção cautelar de valores quando identificado risco de inadimplemento.	Contratada
15	Gestão do Contrato	Necessidade de aditivo por alteração de escopo não prevista originalmente.	Superveniência de fato não identificado no planejamento da contratação; alteração de norma técnica aplicável ao objeto.	Atraso na execução; impacto no valor e no prazo contratual.	2	3	**6**	Análise técnica da alteração e formalização por termo aditivo, observados os limites e requisitos do RLC.	Contratante
16	Gestão do Contrato	Vícios ou defeitos identificados após o recebimento provisório.	Execução em desconformidade com as especificações técnicas; uso de materiais fora do padrão exigido.	Retrabalho às expensas da Contratada; atraso no recebimento definitivo do objeto.	2	3	**6**	Fiscalização técnica rigorosa antes do recebimento provisório, com exigência de correção prévia ao recebimento definitivo.	Contratada
17	Gestão do Contrato	Rescisão contratual por inexecução total ou parcial.	Descumprimento reiterado de obrigações contratuais pela Contratada; inadimplência financeira ou técnica.	Interrupção da prestação do serviço; necessidade de nova contratação emergencial; aplicação de sanções.	1	5	**5**	Acompanhamento contínuo da execução, com aplicação escalonada de sanções antes da rescisão e execução da garantia contratual.	Contratante

18	Gestão do Contrato	Sinistros, acidentes de trabalho ou danos a terceiros durante a execução.	Descumprimento de normas regulamentadoras de segurança do trabalho; ausência ou uso inadequado de EPIs.	Responsabilização civil e trabalhista; paralisação de frentes de serviço; dano à imagem institucional.	2	4	**8**	Exigência de PGR/PCMSO e de EPIs adequados; fiscalização do cumprimento das Normas Regulamentadoras aplicáveis.	Contratada
19	Gestão do Contrato	Descumprimento de prazos intermediários do cronograma físico-financeiro.	Subdimensionamento de equipe ou de equipamentos pela Contratada; interferências executivas não planejadas.	Necessidade de replanejamento; risco de atraso na entrega final; aplicação de multa moratória.	3	3	**9**	Acompanhamento mensal do cronograma pela Fiscalização, com notificação formal em caso de desvio relevante.	Contratada
20	Gestão do Contrato	Pleito de reequilíbrio econômico-financeiro fora das hipóteses previstas nesta Matriz.	Interpretação extensiva de evento pela Contratada; ausência de delimitação suficientemente clara na Matriz original.	Litígio administrativo; risco de indeferimento e de judicialização da controvérsia.	2	3	**6**	Análise fundamentada do pleito à luz da alocação de riscos constante desta Matriz, com resposta formal e motivada.	Contratante

(1) Fases de planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gestão do Contrato.
(2) Evento incerto que, se ocorrer, afeta os objetivos da contratação.
(3) Condições que viabilizam o evento.
(4) Consequências da ocorrência.
(5) A avaliação da Probabilidade e do Impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P)

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado; raro, mas com histórico de ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto (I)

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo, sem possibilidade de recuperação.	5

(6) Nível de risco: baixo, médio, elevado e extremo, conforme definido na tabela abaixo.

Nível de Risco (P × I)

Faixa (P × I)	Classificação
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

(7) Resposta ao risco: indicação da estratégia adotada (mitigar o impacto, evitar a causa, transferir via seguro/garantia ou aceitar o risco), detalhando a ação prática preventiva ou de contingência.
(8) Responsável: Contratante ou Contratada.

Observação: as hipóteses são exemplificativas e não exaustivas.

◆ MÓDULO OPCIONAL — ANEXO II-A: QUADRO DE INOVAÇÕES (obrigatório para obras e serviços de engenharia — art. 157, XXV, c/c art. 210, III, do RLC)
Preencher o Quadro de Inovações conforme modelo institucional, quando o objeto for obra ou serviço de engenharia.

ANEXO III — MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À Companhia Nacional de Abastecimento — Conab. Ref.: [Pregão Eletrônico / Competição Pública / RDC] nº [___/20__]. Processo SEI: [nº].

Identificação do licitante	Preenchimento
Razão social / CNPJ	[ ]
Endereço	[ ]
Telefone / E-mail	[ ]
Representante legal	[ ]

1. Objeto: reproduzir, com fidelidade, a descrição do objeto conforme o item 1.1 do Projeto Básico.
2. Planilha orçamentária proposta — apresentada conforme a estrutura definida pela Conab, com os seguintes elementos por item:

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Vlr unit. (c/ BDI)	Total	Peso %
...	...	...	...	...	...	...	...

Resumo	Valor
Total sem BDI (R$)	[ ]
Total do BDI (R$)	[ ]
Total Geral (R$)	[ ]
Total Geral por extenso	[ ]

Declaramos que os preços propostos foram calculados com estrita observância das regras de BDI vigentes, incluindo todos os tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como fretes e seguros necessários para a perfeita execução do objeto, mantendo-se firmes pelo prazo de validade indicado abaixo.

Validade da proposta: [_____] dias da abertura do certame (mínimo de 60 dias). Local e data: [CIDADE – UF, DATA].

Assinatura e carimbo do representante legal: [ ]

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Objeto: [reproduzir a descrição do objeto].

À Companhia Nacional de Abastecimento — Conab. Ref.: Pregão Eletrônico nº [___/20__].

Declaramos que, em [__/__/____], o(a) Sr.(a) [NOME], portador(a) do RG nº [ ] e do CPF nº [ ], representante da empresa [RAZÃO SOCIAL], compareceu perante a Conab/[UNIDADE/SUREG], situada em [ENDEREÇO – CEP], e vistoriou os locais de execução dos serviços objeto da contratação, tomando plena ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

Declaramos, ainda, que a realização da vistoria técnica e o pleno conhecimento das condições locais impedem a alegação futura de desconhecimento das condições de execução, não podendo servir de argumento para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou para justificar o descumprimento de obrigações contratuais junto à Conab.

Local e data: [CIDADE – UF, __/__/____].

Assinatura/carimbo do representante da empresa: [ ].

Visto do responsável pela Conab: [nome/cargo/matrícula].

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Objeto: [reproduzir a descrição do objeto].

À Companhia Nacional de Abastecimento — Conab. Ref.: Pregão Eletrônico nº [___/20__].

A empresa [NOME E QUALIFICAÇÃO], CNPJ nº [ ], sede em [ENDEREÇO], neste ato representada por [REPRESENTANTE / CARGO], **DECLARA** que optou por não realizar a vistoria aos locais de execução, que conhece as condições locais e o grau de dificuldade para a perfeita execução do objeto, que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão, conforme o item 9 do Projeto Básico, e que se **COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos.

Declaramos, ainda, que a não realização da vistoria técnica não poderá ser utilizada como argumento para futuros pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou para justificar o descumprimento de obrigações contratuais junto à Conab.

Local e data: [CIDADE – UF, __/__/____].

Assinatura/carimbo do representante da empresa: [ ].

ANEXO VI — MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS (ANEXO IV, RLC)

Declaro que a empresa [RAZÃO SOCIAL], CNPJ nº [ ], possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Órgão/Empresa (com endereço)	Vigência do contrato	Valor remanescente (R$)*
[ ]	[ ]	[ ]
Valor total dos contratos (R$)	[ ]	[ ]

Nota 1: informar o endereço completo dos órgãos/empresas com contratos vigentes.
Nota 2: (*) considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Verificação (art. 131, §6º, IV, do RLC): O valor total dos contratos firmados pela licitante, dividido por 12 (doze), não poderá ser superior ao seu Patrimônio Líquido, conforme a fórmula abaixo, cujo resultado deve ser igual ou superior a 1 (um). Diferença superior a 10% (positiva ou negativa) entre a Receita Bruta da DRE e a declaração exige justificativa.

ANEXO VII — MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Indicador	[Nº + título do indicador]
Finalidade	Padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados.
Meta	Verificar a prestação dos serviços conforme Edital, Projeto Básico e Anexos.
Instrumento de medição	Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços.
Forma de acompanhamento	Verificação, pela Fiscalização, dos serviços prestados no padrão estabelecido.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de cálculo	(Total de materiais e serviços recebidos em conformidade ÷ total previsto) × 100.
Início de vigência	Data de início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no pagamento

Conformidade (%)	Efeito no pagamento
De 95% a 100%	100% da fatura (Sem glosa)
De 85% a menos de 95%	95% da fatura (Glosa de 5%)
De 75% a menos de 85%	90% da fatura (Glosa de 10%)
De 65% a menos de 75%	80% da fatura (Glosa de 20%) e abertura de processo sancionatório
Abaixo de 65%	Recusa da parcela do serviço e aplicação de multa de [3%] sobre o valor mensal
Nota: O termo "menos de" elimina qualquer conflito de arredondamento técnico.	

► Nota ao elaborador: calibre as faixas e os percentuais conforme o objeto, evitando a sobreposição/duplicidade que constava do modelo original (duas faixas distintas previam, ambas, “85% da fatura”). Harmonize o IMR com as sanções do item 25.

1. Recomenda-se que cada contratação apresente indicadores específicos para seu objeto. Por exemplo:

1.1. conformidade dimensional;

1.2. acabamento;

1.3. ensaios;


1.4. percentual executado.

Tabela de avaliação


Item	Critério de avaliação	Adequado	Inadequado
1	Uso de materiais com qualidade.		
2	Fornecimento de materiais.		
3	Uso de produtos conformes às classificações dos órgãos de controle.		
4	Substituição de equipamentos sem prejuízo à execução.		
5	Índice de satisfação do serviço superior a 90%.		

ANEXO VIII — MODELO DE PLACA DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA

Vista Frontal da placa de serviços de engenharia

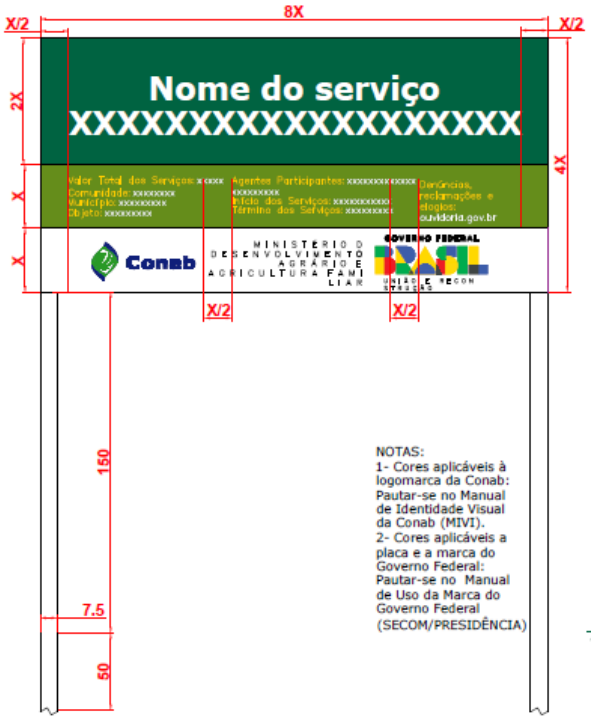

Vista Lateral da placa de serviços de engenharia

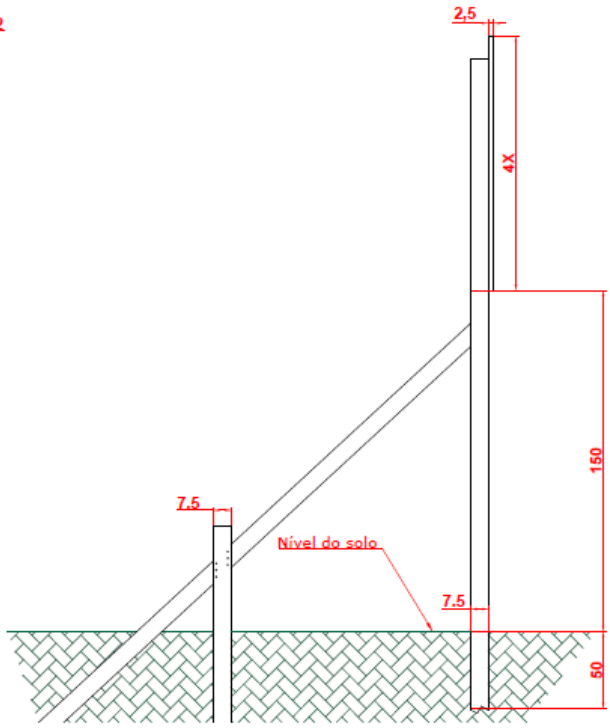

► **Nota ao elaborador:** atualizar o modelo institucional de placa de obra/serviço de engenharia vigente à época da contratação, observando as dimensões mínimas, materiais, identidade visual, logomarcas, informações do contrato, identificação do responsável técnico e número da ART/RRT, conforme os padrões da Conab, a ABNT NBR 12284 e demais normas aplicáveis.

Atenção: Em caso de alteração dos padrões institucionais ou de restrições legais supervenientes, especialmente aquelas decorrentes da legislação eleitoral, o modelo deverá ser adequado às orientações oficiais vigentes antes de sua utilização.

ANEXO IX — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (EXEMPLO)

► **Nota ao elaborador:** este anexo constitui o núcleo técnico do Projeto Básico. Antes da elaboração das especificações, identificar e relacionar todos os documentos técnicos que compõem o Projeto Básico, indicando o respectivo número SEI. Os documentos indicados deverão estar efetivamente anexados ao processo e ser compatíveis com o nível de detalhamento necessário à caracterização do objeto e à formulação das propostas.

1. Documentos técnicos integrantes

Observação: os documentos marcados como "Não aplicável" deverão possuir justificativa técnica compatível com o objeto.

Documento	Nº SEI	Situação
Planta baixa	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Cortes	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Fachadas	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Planta de cobertura	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Planta de demolição	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Planta de locação	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Memorial descritivo	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Memorial de cálculo	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Caderno de especificações	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Detalhes construtivos	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Esquemas elétricos	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Esquemas hidráulicos	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Levantamento fotográfico	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Relatórios de inspeção	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável
Laudos	_____	☐ Aplicável ☐ Não aplicável

2. Sistemas objeto do detalhamento

2.1. Serviços preliminares e instalação do canteiro;

2.2. Demolições e remoções;

2.3. Fundações e estrutura;

2.4. Vedações e alvenarias;

2.5. Cobertura;

2.6. Impermeabilização;

2.7. Revestimentos de pisos e paredes;

2.8. Forros;

2.9. Pintura;

2.10. Esquadrias, ferragens e vidros;

2.11. Instalações hidrossanitárias;

2.12. Instalações elétricas e de iluminação;

2.13. Instalações de climatização;

2.14. Outros sistemas específicos ao objeto (SPDA, combate a incêndio, sonorização, gás, pavimentação externa, drenagem etc.).

Atenção: para cada sistema mantido nesta seção, deverão ser elaboradas especificações técnicas completas, contemplando, no mínimo: descrição da solução adotada; materiais e equipamentos; método executivo; requisitos de desempenho; critérios de medição e aceitação; ensaios, testes ou comissionamentos, quando aplicáveis; e normas técnicas de referência. A simples indicação do nome do sistema não supre a necessidade de detalhamento técnico.

3. Ordem de prevalência

3.1. Este Projeto Básico e seus Anexos;

3.1.1. As cotas dos desenhos prevalecem sobre as dimensões medidas em escala;

3.1.2. Desenhos de data mais recente prevalecem sobre os mais antigos;

3.1.3. Desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

3.1.4. Em casos omissos, a Contratada deverá consultar a Fiscalização, sendo as decisões sempre formalizadas por escrito.

3.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO pertinentes ao objeto (art. 556, I, 'd', do RLC 10.901);

3.3. Instruções e resoluções do sistema CREA/CONFEA e CAU/BR (art. 556, I, 'b' e 'c');

3.4. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive das concessionárias de serviços públicos (art. 556, I, 'a');

3.5. Caderno de Encargos SINAPI, para itens com composição nesse sistema.

4. Materiais, mão de obra e equipamentos

4.1. Exigência de que todos os materiais sejam novos, de primeira qualidade e conformes às normas ABNT aplicáveis, salvo previsão expressa de reaproveitamento;

4.2. Obrigação de aprovação prévia e por escrito da Fiscalização para qualquer substituição de material ou equipamento especificado (art. 157, XVII, 'b', do RLC 10.901);

4.3. Faculdade da Fiscalização de determinar retirada e substituição de material aplicado sem aprovação prévia, às expensas da Contratada;

4.4. Responsabilidade da Contratada pelo fornecimento de toda a mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos necessários à execução no prazo contratual (art. 157, XVII, 'j').

5. Critérios de medição

5.1. Referência cruzada à memória de quantitativos (Anexo [X]) e à planilha orçamentária (Anexo [XIII]) como documentos definidores das unidades de medida e dos critérios de medição de cada item;

5.2. Vedação de medição e pagamento de serviços executados em desacordo com as especificações deste Anexo;

5.3. Obrigação de refazimento às expensas da Contratada de todo serviço rejeitado pela Fiscalização;

5.4. Para empreitada por preço global: referência ao Cronograma Físico-Financeiro (Anexo [XV]) como base das medições por etapa, observado o limite de retenção de 10% do valor global até o recebimento definitivo (art. 532, §§ 3º e 4º, do RLC 10.901);

5.5. Procedimentos de recebimento provisório e definitivo conforme arts. 532 e 533 do RLC 10.901 e item [17] deste Projeto Básico.

5. Casos omissos

5.1. Que serviços constantes dos projetos e não mencionados nas especificações, e serviços mencionados nas especificações e não constantes dos projetos, são partes integrantes do objeto sem ônus adicional para a Conab;

5.2. Que casos omissos ou duvidosos devem ser submetidos à Fiscalização para orientação, sempre formalizada por escrito e registrada no Livro Diário de Obra;

5.3. Que a Contratada não pode invocar erro ou omissão deste Projeto Básico para eximir-se de suas responsabilidades contratuais (art. 157, XVII, 'l', do RLC 10.901).

ANEXO X — MEMÓRIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS (EXEMPLO)

► **Nota ao elaborador:** a memória de cálculo dá rastreabilidade aos quantitativos e aos preços. Preencha com dados reais e indique o número SEI de cada documento de origem.

Atenção: Os documentos utilizados como base da memória de cálculo deverão corresponder aos documentos técnicos relacionados no Anexo IX.

1. Bases de referência adotadas

1.1. Sistemas de preços

1.1.1. Para cada base consultada, registrar:

1.1.1.1. Nome do sistema (SINAPI, SICRO, ou outra fonte nos termos do art. 160);

1.1.1.2. Mês e ano da tabela;

1.1.1.3. Unidade da Federação de referência;

1.1.1.4. Regime de encargos sociais (onerado ou desonerado).

1.1.2. O SINAPI é a fonte primária para construção civil em geral; o SICRO, para obras rodoviárias. O uso de outra fonte exige justificativa expressa de inviabilidade do SINAPI/SICRO para o item específico, fundamentada no art. 160 do RLC 10.901.

2.2. Itens com fonte alternativa ao SINAPI/SICRO

2.2.1. Para cada item cujo custo unitário não foi obtido do SINAPI/SICRO, registrar:

2.2.1.1. Identificação do item na planilha;

2.2.1.2. Código SINAPI/SICRO buscado e motivo da não utilização;

2.2.1.3. Fonte alternativa adotada e referência do valor pesquisado;

2.2.1.4. Nome e matrícula do responsável pela justificativa técnica.

3. Memória de quantitativos

3.1. Estrutura obrigatória por item

3.1.1. Para cada item da planilha orçamentária (Anexo [XIII]), a memória deve conter:

3.1.1.1. Critério de medição adotado (área líquida, área bruta, comprimento desenvolvido, volume, unidade etc.) e norma ou referência técnica que o fundamenta;

3.1.1.2. Dimensões levantadas com indicação do documento de origem (número SEI da planta, corte, elevação ou levantamento de campo);

3.1.1.3. Identificação do documento de origem (prancha, detalhe, memorial, levantamento de campo, relatório ou outro documento técnico) e respectivo número SEI.

3.1.1.4. Desenvolvimento do cálculo — fórmula, dimensões parciais, subtotais por ambiente ou trecho;

3.1.1.5. Deduções aplicadas (vãos, aberturas) com critério explícito;

3.1.1.6. Quantitativo total apurado e quantitativo adotado na planilha;

3.1.1.7. Justificativa de qualquer diferença entre os dois.

► Nota ao elaborador: quando a memória de cálculo for desenvolvida em planilhas eletrônicas, estas deverão conter fórmulas editáveis, identificação do autor, data da elaboração e versão do documento, sendo juntadas integralmente ao processo SEI.

3.2. Memórias mínimas por grupo de serviço

3.2.1. A memória deve abranger, no mínimo, os seguintes grupos, aplicando a estrutura do item 3.1 a cada um:

3.2.1.1. Serviços Preliminares: prazo em meses; jornada do engenheiro e do encarregado (horas/mês); área de andaime; dimensão da placa de obra; períodos de locação de equipamentos e contêineres;

3.2.1.2. Demolições: volume por elemento demolido (área × espessura), com referência à planta;

3.2.1.3. Estrutura: áreas e volumes de concreto por elemento; área de forma; massa de aço estimada por elemento;

3.2.1.4. Vedações e Revestimentos: área por ambiente e trecho, com deduções;

3.2.1.5. Impermeabilização: área por superfície, com acréscimos de borda ou sobreposição e respectivo percentual adotado;

3.2.1.6. Instalações Hidrossanitárias: comprimento de tubulação por diâmetro e material, desenvolvido por trecho; quantidade de peças por ambiente;

3.2.1.7. Instalações Elétricas: comprimento de cabos por seção e circuito, com fator de percurso; quantidade de pontos por ambiente; capacidade do quadro de distribuição;

3.2.1.8. Cobertura: área pelo fator de inclinação; comprimento de calhas, cumeeiras e rufos;

3.2.1.9. Pintura: área por superfície e tipo de tinta, coincidindo com os itens de revestimento;

3.2.1.10. Limpeza Final: área de serviço e quantidade de caçambas, com memória de estimativa de volume de entulho.

4. Premissas

4.1. Prazo e jornada

4.1.1. Prazo total da obra em dias corridos ou meses, com referência ao Cronograma Físico-Financeiro (Anexo [XV]);

4.1.2. Dias trabalhados por mês e horas por dia adotados para cada categoria profissional;

4.1.3. Frequência e duração das visitas do engenheiro responsável.

4.2. Produtividade e composições

4.2.1. Código e fonte da composição (SINAPI, SICRO ou própria);

4.2.2. Coeficientes de consumo de materiais, produtividade de mão de obra e tempo de equipamento adotados, nos termos do art. 159, § 1º, do RLC 10.901;

4.2.3. Para composições próprias ou com coeficientes divergentes do sistema de referência: justificativa técnica com identificação do responsável.

4.4. Itens cotados diretamente no mercado

4.4.1. Para itens sem composição analítica disponível nas bases referenciais (equipamentos, materiais especiais, peças industrializadas), registrar:

4.4.1.1. Valor unitário adotado;

4.4.1.2. Fonte de pesquisa e número do documento SEI correspondente;

4.4.1.3. Data da pesquisa;

4.4.1.4. Critério de consolidação do preço de referência (média, mediana ou menor preço), com justificativa, nos termos dos arts. 192 e 196 do RLC 10.901.

4.3. BDI

4.3.1. Registrar as premissas que orientaram cada componente do cálculo, observando os seguintes requisitos do art. 165 do RLC 10.901:

4.3.1.1. O cálculo da taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) é efetuado por meio da equação em que:

4.3.1.1.1. AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

4.3.1.1.2. S: taxa representativa de Seguros;

4.3.1.1.3. R: taxa representativa de Riscos;

4.3.1.1.4. G: taxa representativa de Garantias;

4.3.1.1.5. DF: taxa representativa das Despesas Financeiras;

4.3.1.1.6. L: taxa representativa da Remuneração; e

4.3.1.1.7. I: taxa representativa da incidência de Impostos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

► **Nota ao elaborador:** os percentuais adotados para cada componente do BDI deverão ser tecnicamente justificados e compatíveis com a natureza do objeto, vedada a utilização automática de índices de contratações anteriores sem análise de aderência.

	Obra Bancos B.D.I.	**Encargos Sociais**
GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	
	Total do Grupo	
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	
	Total do Grupo	
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	
	Total do Grupo	
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	
	Total do Grupo	
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	
	Total do Grupo	
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	
2	COFINS - FEDERAL	

3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	
	Total do Grupo	
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=		

ANEXO XI — CURVA ABC (EXEMPLO)

► **Nota ao elaborador:** estes anexos devem ser gerados no sistema oficial de orçamentação, exportados em PDF e juntados ao processo do SEI como documentos próprios. As tabelas abaixo são meramente ilustrativas do formato esperado — não preencher manualmente neste arquivo.

ANEXO XII - ORÇAMENTO ANALÍTICO (EXEMPLO)

Nota: Os valores financeiros mensais deste modelo admitem pequenos ajustes de arredondamento na última casa decimal (centavos) para fins de fechamento contábil das propostas dos licitantes.

ANEXO XIII — CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EXEMPLO)

► **Nota ao elaborador:** considerar eventos externos, como aprovações de projetos e vistorias por concessionárias e demais entidades. O Cronograma Físico-Financeiro deve refletir a sequência executiva do objeto, evitando cronogramas compostos por única etapa global quando o empreendimento admitir decomposição em fases. A compatibilidade entre cronograma, medições e desembolsos deverá ser verificada antes da publicação do certame.

Nota: Os valores financeiros mensais deste modelo admitem pequenos ajustes de arredondamento na última casa decimal (centavos) para fins de fechamento contábil das propostas dos licitantes.

Brasília, 03 de agosto de 2026

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA RIBEIRO DE SANTANA SILVA**, **Gerente de Área - Conab**, em 17/08/2026, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **54953323** e o código CRC **4000C478**.

Referência: Processo nº.: 21200.003900/2026-70	SEI: nº.: 54953323
